

# Aménagement de la RD 115

## Bourg d'AUSSAC

### SUIVI DE TRAVAUX

COMPTE-RENDU N°18

Du : mercredi 10 avril 2019

Entités et adresses	Noms	Coordonnées			PRESENTS	EXCUSES	DIFFUSION	INVITES A LA PROCH. REUN.
		Tél	Fax	E-mail				
Mairie Aussac vadalle	M. Liot Maire M. Montassier Adjoint	05 45 20 61 60 06 75 75 72 68		<a href="mailto:mairie@aussac-vadalle.fr">mairie@aussac-vadalle.fr</a> jpmontassier@gmail.com		X	X	X
ADA Aigre	M. Bourut	05 16 09 56 54		sbourut@cg16.fr		X	X	X
BETG mandataire 1 ter, rue de l'église 16140 AIGRE	M. Christophe TYRE	05.45.23.75.97 06.89.73.45.53		betg16@orange.fr	X		X	X
Atelier du Sablier Le Cruzeau 16 120 Châteauneuf	Mme Anaïs ESCAVI	05 45 21 85 98 06 12 84 90 78		anais.escavi@atelier-du-sablier.fr		X		X
Scotpa LOT 1	M. Blévin M. Epron	05 45 68 04 80 06 76 78 10 19		d.epron@scotpa.fr		X	X	X
Lot 2 Entreprise Jardin Angoumois	M. Revault	05 45 65 80 10 06 08 24 56 18		Jardin.angoumois@wanadoo.fr		X	X	X
SDEG Et Allez	M. Beaulieu M. Vimpère			<a href="mailto:dbeaulieu@sdeg16.fr">dbeaulieu@sdeg16.fr</a> g.vimpere@allez.fr		X	X	X

Objet de la réunion :

## Visite de chantier

Remarque particulière

Le présent compte-rendu de chantier est transmis par messagerie électronique aux intervenants ci-dessus, qui ont un délai de 5 jours ouvrés pour transmettre leurs observations au maître d'oeuvre. Faute de quoi, les mesures et décisions prises dans ledit compte-rendu sont considérées comme acceptées par les intervenants et s'imposent à eux.

### 1. AVANT PROPOS

La commune d'Aussac Vadalle engage l'aménagement du village d'Aussac, traversé par la RD 115.

Les travaux sont répartis en 2 lots désignés ci-dessous :

Lot	Désignation
1	VRD

**2. ATTRIBUTION DES LOTS**

- LOT N°1 **VRD**
- SCOTPA  
ZE Les Savis  
BP 10554  
16160 GOND-PONTOUVRE  
Tél. : 05 45 68 04 80  
Fax : 05 45 68 74 40
  
- LOT N°2 **Aménagements paysagers**  
ENTREPRISE JARDINS DE L'ANGOUMOIS  
16310 Montemboeuf  
05 45 65 80 10

**3. RAPPEL ADMINISTRATIF**

- Marché à procédure adaptée
- Entreprise titulaire du lot n°1 : SCOTPA notifié le 27 08 2018
- Entreprise titulaire du lot n°2 : Jardins de l'Angoumois le notifié le 30 08 2018
- Envoi des OS :
  - LOT 1 : OK
  - LOT 2 : OK
- Avenant :
  - LOT 1 : OK attention reste signature notification

NB : Les situations financières doivent être présentées en trois exemplaires originaux.  
Le dossier d'ouvrage exécuté doit être présenté impérativement lors de la réception définitive.

#### **4. DELAIS DES TRAVAUX**

##### **LOT 1 : VRD**

Le calendrier retenu ce jour est le suivant :

- ☐ Période de préparation du 01 10 2018 au 30 10 2018
- ☐ Réalisation des travaux phase 1
  - ☐ à compter du : **05 11 2018**
  - ☐ Jusqu'au : **20 12 2018**
- ☐ Réalisation des travaux phase 2
  - ☐ à compter du : **07 01 2019**
  - ☐ Jusqu'au : **20 02 2019**
  - ☐ **arrêt pendant le murissement des enrobés**
  - ☐ **marquage et résine : semaine 17 avril 2019**

Suite aux travaux complémentaires, l'ordre de service n°2 a prolongé la phase 1 jusqu'au 15 mars 2019.

##### **LOT 2 : PAYSAGE**

Le calendrier retenu ce jour est le suivant :

- ☐ Période de préparation du 15 01 2019 au 15 02 2019
- ☐ Réalisation des travaux
  - ☐ à compter du : **15 02 2019**
  - ☐ Jusqu'au : **15 03 2019**

M. Revault informe qu'il interviendra semaine 11, du 11 mars au 15 mars 2019.

#### **5. RESEAUX EXISTANTS**

- Sans objet

#### **6. COORDINATION SPS :**

sans objet

#### **7. INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER**

- **Pose du panneau de chantier : OK**
- Pose de la cabane de chantier
- Base de vie :
  - zone parking arrêt bus

## 8. POINTS VUS CE JOUR

### LOT 1


#### MISE EN ŒUVRE DES ENROBES

- Terminée
- Rappel Côté sud, une entrée riveraine n'a pas été traitée dans sa profondeur. La demande du riverain qui a placé des repères de la future maçonnerie est arrivée trop tard. Il est rappelé que les entrées riveraines se sont déroulées en deux campagnes et à aucun moment, un compte rendu ne fait état de cette demande.  
Toutefois, Scotpa est favorable à réaliser cette entrée mais demande un délai et la présence d'une équipe à proximité.
- Il avait été constaté une petite dégradation dans le rampant côté placette de l'abri bus. Il a été très certainement dû à un frottement d'un véhicule. Il a été réparé et recevra les pavés résine.




#### ENDUIT CLAIR

- Réalisé
- Nécessitera un balayage des caniveaux avant réception

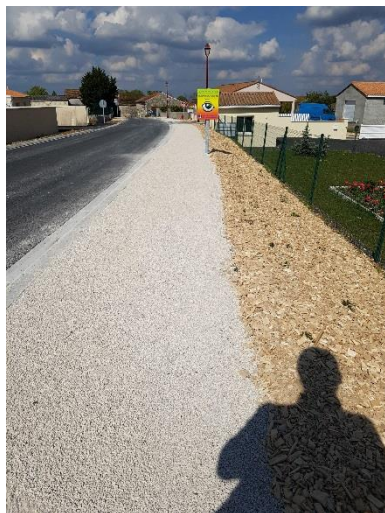

### **PAVE RESINE**

- En cours
- Ce qui est réalisé est très satisfaisant

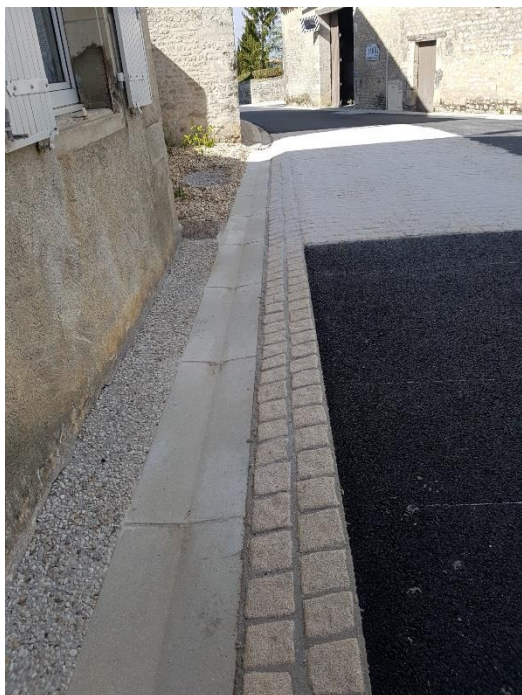

### **SIGNALISATION**

- Rappel : remplacement du panneau B52
- Marquage STOP rue Chalet est à faire

### **BORDURATION**

- Reprise des bavettes des avaloirs : non vérifié ce jour
- Peinture blanche sur bordure des îlots, celles comprises dans l'emprise routière
- Accord de M. Epron

### **REMARQUE PARTICULIERE**

La réparation sur le réseau AEP doit être prise en charge par le concessionnaire selon les recommandations de l'ADA d'AIGRE.

## **LOT 2**

### **Plantations graminées**

- A vérifier par Mme Escavi

### **Plantations Arbres et arbustes**

- Les tuteurages ont été repris

### **Paillage**

- Le paillage est réalisé à 90%



### **Travail au sol et engazonnement :**

- Réalisé à 95 %,
- Bien réalisé



- reste l'accotement côté gauche entrant venant du château d'eau

### **Mobilier**

- reste les huit potelets bois devant les 4 arbres

## **9. SUITE A DONNER ET REUNION DE CHANTIER**

Suite au dernier courriel et à la présente visite, les entreprises tiennent informer le maitre d'œuvre et le maitre d'ouvrage des travaux de finition.

A priori, les travaux paysagers seront terminés sous 5 jour et les travaux de résine en fin de semaine prochaine...Resteront les finitions !!!!

Le délai court jusqu'au 30 avril, la réception sera programmée début mai.

Nous sommes au 18<sup>ème</sup> compte rendu, soit 4.5 mois de période de chantier.....ce qui est anormal.  
Merci de mettre tout en œuvre pour la bonne finition du chantier.

### **Prochaine réunion :**

- **Réception à caler fin avril/début mai**
