

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2019

COMPTE RENDU N°6 : jeudi 4 juin 2020

Objet de la réunion :

Réunion de chantier

Nom du rédacteur : C. TYRE Date de diffusion : 04 06 2020

NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour. Toutefois, M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (portable) soient transmises, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour régler un problème.

Tableau en cours de mise à jour

INTERVENANT			COORDONNEES		diffusion	Présent	excusé
C.C. Cœur de Charente	M. De FALLOIS, Président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46		x		
C.C. Cœur de Charente	M. SEVRIT Vice président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46		x		
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	direction@coeurdecharente.fr			x		
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	fizore@coeurdecharente.fr	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19	x		
					x		
Mairie de AIGRE	M. Combaud, Maire	contact-aigre@aigre.fr	05 45 21 10 56		x		
	M. Typhonnet adjoint				x	x	
Mairie Ambérac	M. Combaud, Maire	mairie.amberac@orange.fr	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58	x		
Mairie Aussac Vadalle	M. Chambre	mairie@aussac-vadalle.fr	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17	x	x	
Mairie de BARBEZIERES		barbezieres@wanadoo.fr	05 45 21 00 62		x		
Mairie de Celettes		cellettes.mairie@wanadoo.fr	05 45 22 28 54		x		
Mairie de La Chapelle		mairie.la.chapelle@wanadoo.fr	05 45 21 12 73		x		
Mairie de Charmé		mairiedecharme@orange.fr	05 45 31 41 61	06 65 53 32 45	x		
Mairie de FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	mairie-de-fouqueure@wanadoo.fr	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53	x		
Mairie de LES GOURS	M. TEXIER, Maire	les-gours.commune@orange.fr	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03	x	x	
Mairie de Lichères	M. Crine	mairie.licheres@wanadoo.fr	05 45 22 73 85	06 13 63 94 66	x		
Mairie de Ligné	Mme Gagneraie maire	mairie.ligne@wanadoo.fr		06 40 81 52 57	x		
Mairie de Mouton		mairie.mouton@wanadoo.fr	05 45 22 54 25		x		
ST-AMANT-DE-BOIXE	Mme Giroux	mairie@saintamantdeboixe.fr			x		
	M. Deschaud-droit		06 44 80 33 87		x		
Mairie de SAINT FRAIGNE	M. BONNET, Maire	mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr	05 45 21 37 67	06 77 58 18 67	x	x	
	M. Bonnet				x	x	
Mairie de TUSSON	M. LHERIDEAU	mairie.tusson@wanadoo.fr	05 45 31 70 49	06 70 57 42 51	x		
Mairie de Vars	M. DE LUSTRAC, Maire	mairie@vars16.fr	05 45 39 73 04	M. Artaud 07 70 11 39 40	x		
Mairie de VERDILLE	Mme Chavouet	mairie.verdille@wanadoo.fr	05 45 21 00 94		x		
Mairie de Vervant	Mme Buton maire	mairie-vervant@orange.fr	05 45 39 77 68		x		
Mairie de Villejoubert	M. Sevrin	mairie.villejoubert@wanadoo.fr		06 22 29 88 34	x		
Mairie de Vouharte	M.	mairie-vouharte@orange.fr	05.45.39.75.18		x		
	M. Magnant		06 33 22 47 87		x		
Mairie de Xambes	M.	mairie.xambes@wanadoo.fr	05 45 39 87 47	06 76 81 08 74	x		
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	betg16@orange.fr	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53	x	x	
Entreprise BTPGT	M. Bernard	bernard.tpgt@orange.fr		06 08 60 13 10	x	x	

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié. Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.

Prochaine réunion :

jeudi 11 juin 2020 à 10h30 à AIGRE, RDV place derrière la mairie

1. RAPPEL DU MARCHE

L'opération concerne :

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2019.
- ENTREPRISE BERNARD TP
- Responsable : M. Bernard Thierry
- Chef de chantier : M. Damien Moreau 06 32 19 46 81

Marché à procédure adaptée à bon de commandes : notifié le 25 07 2019

Mairies concernées : ci-contre

Rappel : Planning du chantier

Le délai contractuel de l'exécution des prestations avait été fixé comme suit (à partir de la réception de la commande) :

- Travaux d'ordre pluvial, borduration : 3 mois
- Travaux de préparation et de revêtements : 7 mois (date butoir du 31 05 2020)

Rappel : crise sanitaire Ordre de service d'arrêt de chantier à partir du 19 mars 2020.

Ordre de service : OS n°validé :

- Reprise chantier : lundi 18 mai
- Délai : 3 mois

Le planning prévisionnel a été envoyé à tous.

Bons de commandes émises

A ce jour, l'ensemble des commandes a été validé et a fait l'objet de 3 ordres de service.

BETG a adressé à l'entreprise les détails et les plans des chantiers.


AIGRE (villejésus)
AMBERAC
AUSSAC
Barbezières
Celettes
La Chapelle
CHARME
FOUQUEURE
LES GOURS
LICHERES
LIGNE
Mouton
Saint Amant de Boixe
SAINT FRAIGNE
TUSSON
Vars
VERDILLE
VERVANT
VILLEJOUBERT
VOUHARTE
Xambes

2. AVANCEMENT DE CHANTIER

- **Verdille**
 - Préparation en cours
- **Barbezières**
 - Préparation terminée
 - Pose bordure terminée
 - Reste les raccords : les surfaces réparées seront plus importantes pour un meilleur résultat (report petit budget sur les bordures non posées).
- **Les Gours**
 - Préparation terminée
- **Saint Fraigne**
 - Voie des Roches : terminée
 - Voie du Défend : reste couche finale
 - Voie Richard : reste couche finale
 - Aucune remarque de la mairie
- **Charmé**
 - Préparation voie Quincornet terminé
- **Ligné**
 - Sentier placette communale : préparation en cours voire terminée
 - Préparation chemin du Moulin : sera fait plus tard, juste avant l'équipe de revêtement

- **Aigre**

- Les préparations se dérouleront semaine prochaine
- Le traitement de la Croix blanche sera fait plus tard, juste avant l'équipe de revêtement
- Information donnée après la réunion en présence de M. Combaud et de M. Typhonnet :
 - Chantier VC 205 Saint Aubin Centre
 - Au carrefour, bâti menaçant de s'écrouler
 - Intervention très certainement en cours d'année avec présence d'engins de terrassement au carrefour, risque de dégradation de l'enduit
 - M. Tyré propose de débiter le chantier au droit du second pilier du n°9 (bombage bleu) et de ne pas traiter la zone carrefour
 - Rappel : la petite impasse après le n°9 est publique selon cadastre.gouv. Il est demandé à la mairie de confirmer ce point.

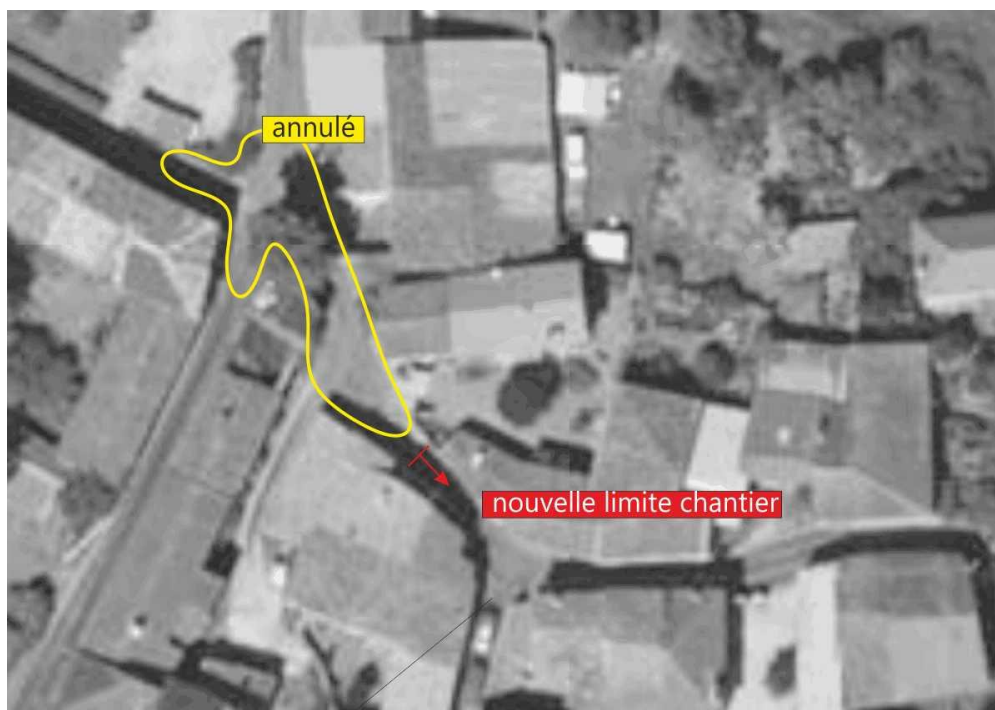

Pour info
voie publique



3. RAPPELS IMPORTANTS

- Vars

Une nouvelle réunion d'implantation est nécessaire pour caler au mieux les prestations qui doivent rester dans un cadre d'entretien et de réparations.
M.. Tyré adressera un courriel.

- Xambes VC cimetière

- Chantier repéré **mais** :

- Il est rappelé la place PMR à l'angle du mur (3.30x5.00). attention la plantation de haie récente peut gêner ?
 - De plus la haie a bien été arrêtée avant le mur du cimetière, mais s'agit il de la future entrée de la parcelle ? alors qu'il est prévu la place PMR ?

4. Déroulement, réunion chantier

L'entreprise doit informer du déroulement du chantier avec les mairies concernées.

Voir planning envoyé.

5. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE FAUCHAGE

Rappel Signalisation des chantiers

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



Arrêtés de voirie

L'entreprise demande les arrêtés de voirie.

Fauchage

Les mairies doivent prévoir la fauche des accotements.
