


Compte rendu du rendez-vous du 05/06/2025 à 11h  
Objet : réglages des modules de détection  
Présents : M. le Maire / M. l'Agent Communal  
M. VIMPERE (Allez ENERGIES) / M. LEFRAIS (WE-EF) / M. NONY (SDEG 16)

- 4 groupes réalisés (luminaires communicants entre eux) :
- . groupe 1 (parking) : L1 / L2 et L3
  - . groupe 2 (cheminement) : L4 et L5
  - . groupe 3 (cheminement) : L7 et L8
  - . groupe 4 (cheminement) : L6 et L9

réglages :  
- groupe 1 : consigne basse 0% / consigne haute 66% (seuil pour respect étude d'éclairement A031575AM8 révisée le 24/04/2025)  
- groupe 2, 3 et 4 : consigne basse 0% / consigne haute 33% (seuil pour respect étude d'éclairement A031575AM8 révisée le 24/04/2025)

fonctionnement sur chaque luminaire :  
- temps de passage de consigne basse à consigne haute (allumage à détection) : 1 seconde  
- temps de maintien d'éclairage après détection : 1 minute  
- temps de passage de consigne haute à consigne basse (extinction sans détection) : 11 secondes

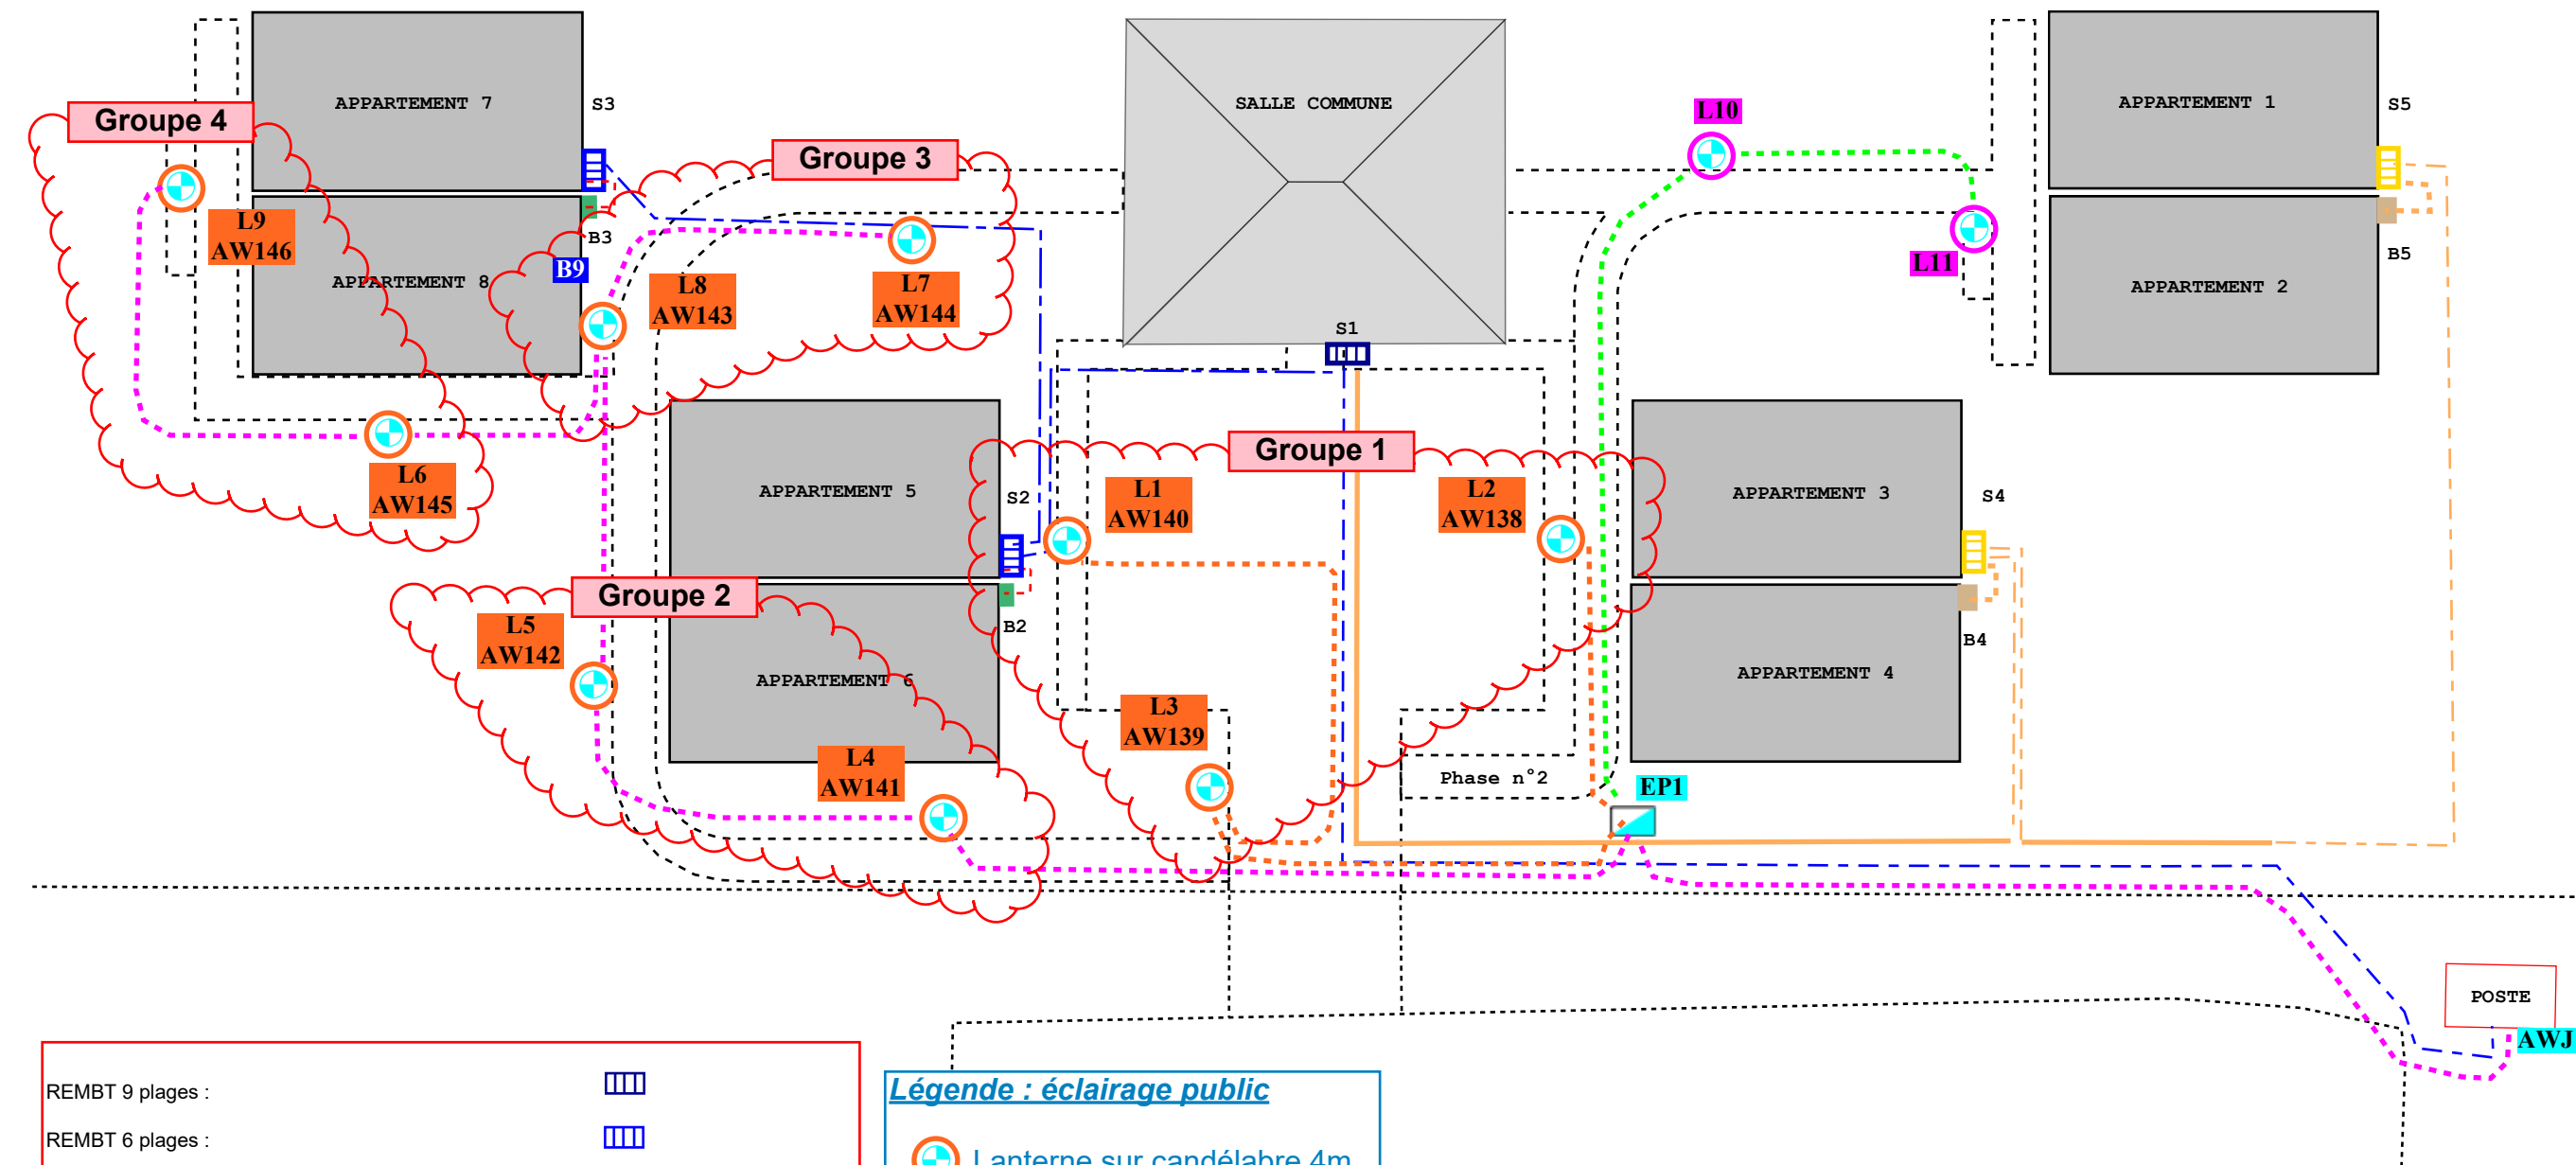

- REMBT 9 pages :
- REMBT 6 pages :
- Coffret coupe circuit :
- Câble 3x150² (réseau) :
- Câble 4x35² (branchement) :
- Fourreau TPC rouge Ø160 en attente pour phase n°2:

**Légende : éclairage public**

- Lanterne sur candélabre 4m (tranche n° 1)
- Lanterne sur candélabre 4m (tranche n° 2)
- Coffret EP



**SDEG 16**

Commune de AUSSAC-VADALLE  
Lieu des travaux : Vadalle -Rue de la République  
Dossier "Eclairage Public" SDEG 16 n° 2023-AE-0444-EP  
Dossier "Basse Tension" SDEG 16 n° 2023-AE-227-AE  
Observations : **Phase n° 1 - Tranchées remises**

**Syndicat Départemental  
d'Electricité et de Gaz  
de la Charente**

Mise à jour le 02/02/2024  
Indice n°1
